



2021年3月


虚拟开放日活动有哪些亮点

3月18日，Lakeridge Health在Facebook Live上主办了一次虚拟开放日，直接与居民交流并展示新的长期护理院。

来自Ajax和杜林区的近80位居民参加了讨论，来自Lakeridge Health、PCL Construction和G建筑设计团队提供了护理院的虚拟“导览”。

讨论的重点包括：

- 概述房屋的平面图，包括安全且风景优美的庭院、支持移动性的更宽的走廊，以及社交空间，便于和同楼居民与家庭建立联系和社交。
- 增强的感染预防和控制（IPAC）措施的详细信息，包括干净和脏污路线分流，以及在护理院区域内以16张病床为一组设立“集群”，以支持疫情爆发管理。
- 逐月施工计划和展示目前正在异地建造的建筑模块。
- 现场调查显示98%的与会者同意杜林区需要更多的长期护理院。

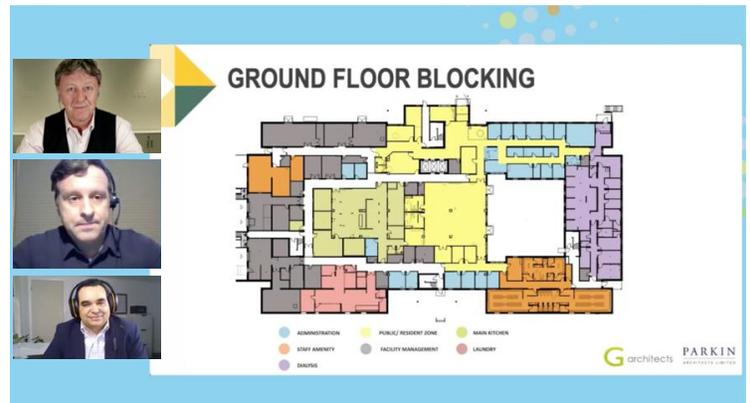

开放日截图

您错过了虚拟

开放日吗？

如果您无法加入我们的虚拟开放日，则可以在我们的[网站](http://www.lh.ca)上观看录影。欢迎继续回来查看我们的[网站](http://www.lh.ca)，了解定期更新和有关未来活动的更多详情。

施工继续快速进展

Lakeridge Health的新的长期护理院工作进展顺利，该院目前正在Ajax Pickering医院隔壁建设。在整个2月和3月，施工团队安装了必要的公用事业服务，例如供电和连通杜林区的雨水和排污主管线。两台塔吊也于本月初抵达，施工团队正在完成浇筑底层地面的工作，并开始架设第一层的墙壁。

现场施工时间大大增加。在项目高峰期将会有每班300名熟练工人，每天将有600多名熟练工人轮班。这相当于每天4,800个工时，对我们的社区和全省产生了巨大的经济推动。

从3月22日开始，现场团队将在周一至周五的早上6:30至午夜工作，并在周六的早上6:30至下午5:00工作。

除现场施工外，建筑的模块化部分也同时在场外建造。我们的施工合作伙伴PCL负责监督建筑物的几个预制组件的设计和安装，例如承重墙板系统、一体化盥洗室以及机械和配电系统。

这种类型的模块化建造以及每天的大量工时是“加速建造试点计划”的一部分，使新护理院的建造速度比传统的长期护理项目更快。

请放心，尽管速度是重中之重，但所有员工和建筑工人都会遵守最严格的健康、安全和设计标准。

车库建设即将开始

接下来，护理院的车库和内部道路网的建设将于3月底/4月初开始。新的长期护理院将满足增加停车位的需求，提供至少250个车位。

车库和重新布局的道路网络都是必不可少的新配置，将有助于满足Ajax Pickering医院及其周围地区增加的流量，并方便患者、访客和工作人员进出新的长期护理院和医院。

为了能够建设车库和道路网络，需要采取分阶段建设，这将一定程度上影响内部道路配置和砍伐一些树木。为了指导这项工作，我们聘请了一位本地经认证的树木学家来完成全面评估，以确定保护和保存哪些树木。我们还咨询了Ajax镇政府，并获批施工许可证。随着我们该项目的推进，不会再有其他树木受到影响。

Lakeridge Health有着悠久的历史，促进整个系统的环境可持续性和能源效率，并且我们致力于重新种植新的树木，让该地区在建设完成后更加美化。



常见问题

感谢大家对我们的长期护理院项目提出问题和反馈。这里回答一些常见问题：

问题1. 护理院何时建成，有多少床位？

新的长期护理院毗邻Ajax Pickering医院，位于Harwood Avenue South和Clements Road West的西北角。预计将于2021年下半年完成，可容纳320张床位。

问题2. 如果我住在Ajax，我是否有更大的机会在新护理院中获得一个床位？

新护理院落成后，将遵循管理全省所有长期护理院病床使用的省级程序。所有符合条件的安大略省居民均通过省级管理的安置程序安排使用任何设施。

安置过程有多个部分的评估，包括护理协调员的评估，以确保病史记录准确，并帮助确定接受长期护理的资格。有关护理院使用的更多信息，请致电310-2222（无需拨打区号）。

问题3. 如何向新的长期护理院求职？

有关如何在新护理院中申请工作的信息一出来就将通知并提供给社区。

问题4. 如何为新的长期护理院提供产品或服务？

根据提议的产品或服务的类型，采购将通过我们的总承包商（PCL）的建筑合同执行，或通过Lakeridge Health的现有采购流程执行。

如果您希望成为Lakeridge Health记录在册的供应商，请向我们的采购协调员[Plexxus](#)注册。

问题5. 有哪些措施来最小化施工现场对附近邻居的噪音？

施工团队将继续竭尽所能，最大程度地减少对周围居民的噪音或影响。PCL已制定了若干符合噪声法规的计划：

- 制定计划解决所有健康、安全和环境问题（包括粉尘控制）；
- 专项交通控制计划，最大程度地减少往返于工地的运输和停车场拥堵；以及，
- 制定计划遵守有关建筑噪音的噪音法规。

在我们尽快努力完成这个重要且急需的长期护理院过程中，我们感激附近邻居一向的谅解。

项目的建设进度很快，以确保新护理院到2021年底完工。

随时向您汇报

我们将继续通过本社区通讯和我们的[网站](#)向您汇报最新进展。

如果您有任何疑问或想了解更多信息，请随时致电905-576-8711转 34167或发送电子邮件至AjaxLTC@lh.ca。

您也可以在[Twitter](#) 和 [Facebook](#)上关注我们。

感谢您对杜林社区这一重要新项目的关注和支持！
